

**Organisation d'une Journée Universitaire sur le
Numérique Responsable**

Théo Palugan
Loïc Lakshminarayanan

BUT 1 Informatique

Groupe : Vénus

Année 2025 - 2026

IUT de Villetaneuse (Sorbonne université paris 13)

Gestion de Projet (SAE S205)

07/01/2026 - 18/01/2026

Sommaire :

1. Cadrage du projet et compréhension du cas	3
2. Analyse des besoins et du périmètre du projet.	5
3. Objectifs du projet et livrable attendus.	8
4. Acteur du projet, organisation et gouvernance.	10
5. Répartition des rôles et responsabilités (RACI).	12
6. Découpage du projet en tâches (WBS).	13
7. Planification du projet et dépendances.	14
8. Budget prévisionnel et arbitrage réalisés.	14
9. Analyse des risques et modalités de suivi.	14
10. Bilan prévisionnel et retour réflexif.	14
11. Contribution individuelle et prise de recul personnelle.	14
12. ANNEXES :	14
1- Information du texte	14
2- Tableau de bord	16

1. Cadrage du projet et compréhension du cas

L'idée du projet vient de la Direction de l'IUT, qui veut renforcer ses actions en faveur du numérique responsable en accentuant davantage sur les pratiques internes et la sensibilisation étudiante.

L'objectif est clair, organiser une journée universitaire dédiée aux enjeux du numérique responsable. Elle n'est pas seulement destinée aux étudiants mais également aux professeurs, chercheurs ainsi qu'au personnel administratif et autre public universitaire. Cette journée s'intitulera "**Le numérique responsable : enjeux, usages et perspectives pour les étudiants**" et permettra de croiser différents regards: celui **académique** avec les enseignants et les chercheurs, **institutionnels** avec La Direction de l'IUT, l'université elle-même et les **professionnels**, avec les experts dans ce secteur.

Ce projet est essentiellement tourné pour les étudiants de l'IUT, mais aussi pour les enseignants et le personnel.

Notre rôle dans ce projet est simple, en binôme, est de piloter l'organisation de l'événement, coordonner, planifier et arbitrer. C'est-à-dire, on doit coordonner les intervenants, planifier les tâches mais aussi prendre des décisions.

Est-ce un projet ?

Cet événement est bel et bien un projet car pour être considéré comme un projet il faut respecter certains critères qui sont :

- Découvert : Le fait que nous devons préparer cette journée montre qu'elle n'est plus à un stade de rêve mais bien, une intention concrète et que nous devons tout mettre en place pour que ce projet se concrétise.
- Temporaire : Ce projet a une date de début qui a déjà commencé et une date de fin qui se situe le jeudi 14 mai. Durant cette période, nous allons devoir gérer correctement le temps associé à chaque tâche pour ne pas prendre de retard et/ou ne pas pouvoir organiser cette journée
- Budget : Pour organiser cette journée nous avons un budget donné par l'IUT qui est de 2 000 €, nous pouvons aussi avoir des partenariats externes qui pourraient nous aider pour élargir le budget mais nous n'avons aucune garantie sur l'obtention et le montant. C'est à nous de gérer correctement les dépenses reliées à cette journée.
- Novateur : Ce projet n'est pas une copie d'un autre mais bel et bien une invention toute neuve sur le thème de la journée, son organisation et son déroulement.

- Incertitude : Il y a aussi des parts d'ombres sur cette journée et surtout sa préparation car pour le budget par exemple les partenariats externes ne dépendent pas de nous comme aussi l'investissement des associations mais encore les variables exogènes comme une loi. Nous allons donc essayer de prendre de nombreux facteurs en compte pour réaliser ce projet et de prévoir des plans de secours.
- Objectif déterminé : Notre objectif est clair, nous devons organiser une journée sur le thème du numérique responsable et la proposer au plus grand nombre d'étudiants possible pour sensibiliser le plus de personnes possible en fonction des différentes restrictions qui nous sont imposées.

Notre projet comporte également toutes les caractéristiques d'un projet comme :

- Fréquence : Cet événement n'est pas commun pour nous et il y a de grandes chances que ce soit le seul sur ce domaine-là ce qui le rend original car nous n'aurons pas forcément la chance de pouvoir en refaire un car il n'a jamais été organisé auparavant à notre connaissance.
- Décisions associées : Certaines de nos décisions seront très certainement irréversibles je pense par exemple des coûts engendrés mais inutile par exemple une commande de décoration mais qui ne respecte pas la charte graphique.
- Variables influentes : Il y aura sûrement de nombreuses variables d'influence qui seront exogènes surtout en ce qui concerne les livraisons ou encore la disponibilité des associations et des personnes participant à la bonne réalisation de ce projet.
- Perturbation : Certaines des étapes du projet vont sûrement s'avérer difficiles et souvent ne vont peut-être pas être faciles à décaler et vont sûrement être coûteuses en temps, argent, ... Pour être corrigées.
- Impact futur : Nous allons devoir aussi gérer les tâches prioritaires et bien l'organiser il faudrait peut être par exemple gérer d'abord les professionnels invités avant de gérer la décoration ou encore peut-être gérer la communication. Il faudra donc que nous choisissons les tâches qui devront être prioritaires.
- Marge de liberté : Malgré le fait que la journée est un thème nous avons un niveau de liberté assez élevé concernant un grand nombre de points comme par exemple le type de décoration (si besoin et doit respecter charte graphique), les associations, les professionnels invités, la sécurité, ... En terme de personne possible à faire intervenir nous sommes vraiment libres.

2. Analyse des besoins et du périmètre du projet.

Besoins	Traduction des besoins	Explications du besoin
Renforcer ses actions en faveur du numérique responsable.	Besoin réel	Le but est de montrer que l'IUT veut se moderniser en prenant compte des facteurs du numérique responsable.
Sensibilisation des étudiants.	Besoin réel	Faire en sorte que les étudiants se rendent compte de l'impact du numérique responsable.
Permettre de croiser les regards académiques, institutionnels et professionnels.	Exigence fonctionnelle	Rassembler un maximum de personnes de tout endroit pour participer à cette journée et faire transmettre leurs connaissances aux étudiants.
Accessible à un public majoritairement étudiant.	Exigence non fonctionnelle	Les personnes majoritairement visées par cette journée sont les étudiants donc les informations transmises durant la journée, doivent être le plus clair et le plus compréhensible possible.
Journée visible, crédible et conforme à ses valeurs.	Exigence non fonctionnelle	Organiser un événement respectant les engagements de l'IUT et en conservant une bonne image
Ne doit pas mobiliser des moyens excessifs.	Exigence non fonctionnelle	Lors de la journée nous ne devons pas mobiliser tout l'IUT mais seulement le matériel, les zones et le budget qui nous a été attribués.
Nécessité de valider le positionnement général de l'événement, son intitulé et les messages diffusés.	Besoin réel	Le nom de la journée et les idées que nous voulons propager à l'issue de cet événement.
Garantir la cohérence institutionnelle.	Exigence fonctionnelle	S'assurer que l'événement respecte les principes et les règles de l'IUT
Les actions de promotion doivent	Exigence non fonctionnelle	Il faut rester cohérent entre les différentes affiches, même style,

respecter une charte graphique précise.		même police d'écriture etc...
Budget maximum de 2 000 €.	Exigence non fonctionnelle	Le total des dépenses pour la bonne réalisation de la journée ne doit pas dépasser les 2 000 € sans compter les partenariats externes.
L'utilisation du budget doit respecter les procédures internes de validation.	Exigence non fonctionnelle	Dès que nous voudrions utiliser une part du budget nous devons attendre une validation préalable pour pouvoir l'utiliser, pour s'assurer que l'argent soit utilisé intelligemment, en évitant tout gaspillage inutile (ou toutes dépenses inutiles).
Le choix du format de l'événement.	Exigence non fonctionnelle	Il faut choisir entre si on fait l'événement tout en présentiel ou en hybride afin de pouvoir proposer la meilleure prestation possible.
La journée universitaire devra se tenir le jeudi 14 mai.	Exigence non fonctionnelle	La date à laquelle doit se dérouler cette journée, ce qui signifie aussi qu'il n'y a plus de retour en arrière et que le projet est censé être fini pour cette date.
Toute modification du format, du contenu ou des modalités d'organisation devra donc être pensée en tenant compte de cette contrainte temporelle forte.	Exigence non fonctionnelle	il faudra que nous réfléchissions aux conséquences des décisions que nous allons prendre durant des étapes cruciales du projet car elle pourrait s'avérer irréversible et donc créer des problèmes.

Cahier des charges simplifié :

Rubriques	Spécifications
Contexte du projet	L'université souhaite renforcer ses actions en faveur du numérique responsable en sensibilisant les étudiants et en accentuant davantage sur ses pratiques internes tout en respectant un cadre institutionnel contraint
Besoins principaux	Informar les étudiants à propos du numérique responsable, favoriser les échanges entre les différents regards (académiques, institutionnels et professionnels) et valoriser l'image de l'IUT à travers un événement crédible et conforme à ses valeurs.
Bénéficiaires	les étudiants de l'IUT (principalement), les enseignants, les chercheurs et le personnel administratif
Exigences fonctionnelles	Rassembler les experts (académiques et professionnels) afin de transmettre leur connaissance, tout en s'assurant que l'événement respecte les principes et les règles de l'IUT (cohérence institutionnelle).
Exigences non fonctionnelles	Garantir un contenu clair, accessible aux étudiants, respecter la charte graphique de l'IUT tout en s'assurant que tout est en adéquation avec les valeurs de l'IUT, respecter le budget autorisé et l'utiliser intelligemment
Contraintes majeures	Date limite du jeudi 14 mai (non négociable), budget maximum autorisé aux alentours de 2000€ et forte dépendance aux validations de la direction de l'IUT et du service de communication
Périmètre du projet	inclus : pilotage de la journée (organisation), arbitrage, planification et coordination des différents intervenants ainsi que la gestion du budget exclus : exécuter directement toutes les tâches.

Parties prenantes clés	Direction de l'IUT, service de communication, enseignants, associations étudiantes, les différents intervenants (experts), et le service logistique
------------------------	---

3. Objectifs du projet et livrable attendus.

Notre objectif principal consiste à : Organiser une journée institutionnelle permettant de sensibiliser au minimum 60% des étudiants de l'IUT sur les enjeux du numérique responsable avant le jeudi 14 mai 2026.

Types Objectifs	Objectifs	Livrables
Secondaire	Permettre aux étudiants de rencontrer des personnes de différents horizons tel que des professionnels, des chercheurs ainsi que la Direction de l'IUT au cours du 14 mai.	Fiche de présence des personnes ayant assisté et participé à l'événement
Stratégique	Inviter au minimum 3 intervenants issus de milieux différents confirmés avant le 6 avril 2026.	Un document complet avec le planning et les intervenants confirmés pour la journée
Stratégique	Garantir que 100 % des contenus présentés respectent les principes du numérique responsable ainsi que les valeurs de l'IUT avant le 19 mars 2026.	Grille de conformité qui permet de voir si tous les critères sont respectés
Opérationnel	L'équipe de projet à la nécessité de valider le positionnement général de l'événement, son intitulé et les messages diffusés avant le 19 mars.	Une fiche synthétique signée par la direction fixant l'intitulé, et les messages clés de l'événement.

Opérationnel	Déterminer et valider le format logistique définitif de la journée (présentiel ou hybride) avant le 23 avril.	Une fiche récapitulative signée par la direction fixant le format (présentiel/hybride) et les salles prévues pour l'événement.
Opérationnel	Concevoir et diffuser au moins dix supports de communication (affiches, réseaux sociaux) conformes à la charte graphique de l'IUT avant le 8 mars	Ensemble des fichiers numériques (affiches, posts réseaux sociaux, bannières) conformes à la charte graphique de l'IUT
Opérationnel	Organiser la journée du 14 dans la limite du budget maximal autorisé de 2 000 €	Un tableau avec l'ensemble des dépenses (ne dépassant pas les 2 000
Opérationnel	Garantir un contenu accessible et compréhensible pour au moins 60% des étudiants (même non spécialiste)	Questionnaire de fin sur l'ensemble des informations de l'événement

In Scope	Out of Scope
Planifier la journée du jeudi 14 mai en réservant des salles et du matériel nécessaire.	La prise en charge des repas ou des collations pour les étudiants et les intervenants.
Accueillir et organiser les différents types de profils (intervenants) de l'événement pour une bonne coordination.	Le suivi technique des mesures numériques responsables dans l'IUT après le 14 mai.
Création des visuels et de leurs diffusions contenant les informations pour être distribué auprès des étudiants de l'IUT	L'accueil d'étudiants provenant d'autres sites ou d'autres universités.

	Assurer les moyens de transport des intervenants.
--	---

Justification :

Nous estimons que planifier la journée, accueillir et coordonner les différents intervenants, créer des visuels font parties intégrantes de notre projet. Ce qui n'est pas le cas pour la prise en charge des repas, le suivi technique des mesures numériques responsables dans l'IUT, l'accueil d'étudiants provenant d'autres sites et également assurer les moyens de transport des intervenants.

4. Acteur du projet, organisation et gouvernance.

Acteur du Projet

Rôles	Acteurs
Le client / Le Maître d'Ouvrage	La direction de l'IUT (elle est à l'origine de la demande)
Le Maître d'Œuvre	L'équipe de projet
Le chef de projet	Nous, le binôme d'étudiants
Les acteurs contributeurs	- Le service de communication - Le service logistique - Enseignant et chercheur - Les professionnels - Les associations étudiantes - Le personnel administratif

Organisation du projet

L'organisation globale du projet repose donc sur de la coordination entre les différents acteurs car il est dit qu'on ne dispose d'aucune autorité hiérarchique directe.

Tout d'abord, La direction intervient dès le début du projet, mais aussi lors de différents moments clés pour valider :

- le positionnement général de l'événement, son intitulé et son contenu (les

- messages diffusés)
- Le format logistique de la journée (présentiel ou hybride)
- Les différentes dépenses du budget

Ensuite, le service de communication intervient pour la vérification des supports de communications respectant la charte graphique (validation)

Mais aussi, le service de logistique qui, lui, intervient pour la validation et la gestion de l'utilisation des salles et du matériel.

Cette organisation doit également prendre en compte :

- La disponibilité incertaine des enseignants
- les différentes validations
- le rôle des associations étudiantes dans la mobilisation des étudiants
- La participation incertaine des professionnelles (acteurs externes)

Gouvernance du projet

La gouvernance du projet représente l'ensemble des règles de décision, des circuits de validation, les modalités de pilotage et la répartition des pouvoirs pour assurer une cohérence.

Répartition des responsabilités :

- La direction de l'IUT fixe les orientations, en validant les choix structurants et en contrôlant le budget.
- L'équipe de projet coordonne les acteurs, planifie les actions et prend les décisions nécessaires à la bonne réalisation de l'événement.
- Les services de logistique, communication et les partenaires sont consultés sur les décisions relevant de leur domaine d'expertise
- Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le chef de projet et les acteurs contributeurs travaillent pour mettre en œuvre le projet et partager la responsabilité globale.

La gouvernance est également soumise à différentes contraintes telles que :

- Un budget limité à 2 000 €
- Une date fixée au jeudi 14 mai 2027
- Validations institutionnelles
- Participation incertaine des intervenants et des partenariats
- Des décisions sans retour en arrière possible

5. Répartition des rôles et responsabilités (RACI).

	La direction de l'IUT	Chef de projet	communication	logistique	associations étudiantes	Enseignant	personnel administratif
Document de Positionnement de l'événement	A	R	C	I	I	C	I
Validation de la direction sur intitulé et messages	A	R	C	I	I	C	I
Choix du format validé (présentiel / Hybride)	A	R	C	C	C	C	C
Planning détaillé du Déroulement / élaboration de la journée	A	R	C	C	C	C	C
Liste des intervenants	I	A	I	I	R	I	C
Plan logistique Validé (salles, matériel)	I	A	I	R	I	I	C
Supports de communication	I	A	R	I	C	C	C
Suivi budgétaires	A	R	C	C	I	I	I

Explication du tableau RACI :

Étant donné que le chef de projet est chargé de rédiger le document de positionnement de l'événement pour la journée du 14 mai 2026 (organisée pour l'IUT), la direction de l'IUT sera alors responsable du résultat, les autres acteurs vont donner leurs avis ou seront informés pour la bonne organisation et coordination du projet.

Le même schéma va s'appliquer pour la validation de l'intitulé et du message, le choix du format, le planning du déroulement de la journée et ainsi que le suivi budgétaire.


Pour la liste des intervenants, le plan logistique et les supports de communication seront gérés respectivement par les associations étudiantes, le service logistique et le service de communication mais le responsable du résultat restera le chef de projet, les autres acteurs vont, une fois de plus, donner leurs avis ou seront informés pour la bonne organisation et coordination du projet.

6. Découpage du projet en tâches (WBS).

Livrable = Bleu

Sous-livrable = Vert

Tâche = Jaune

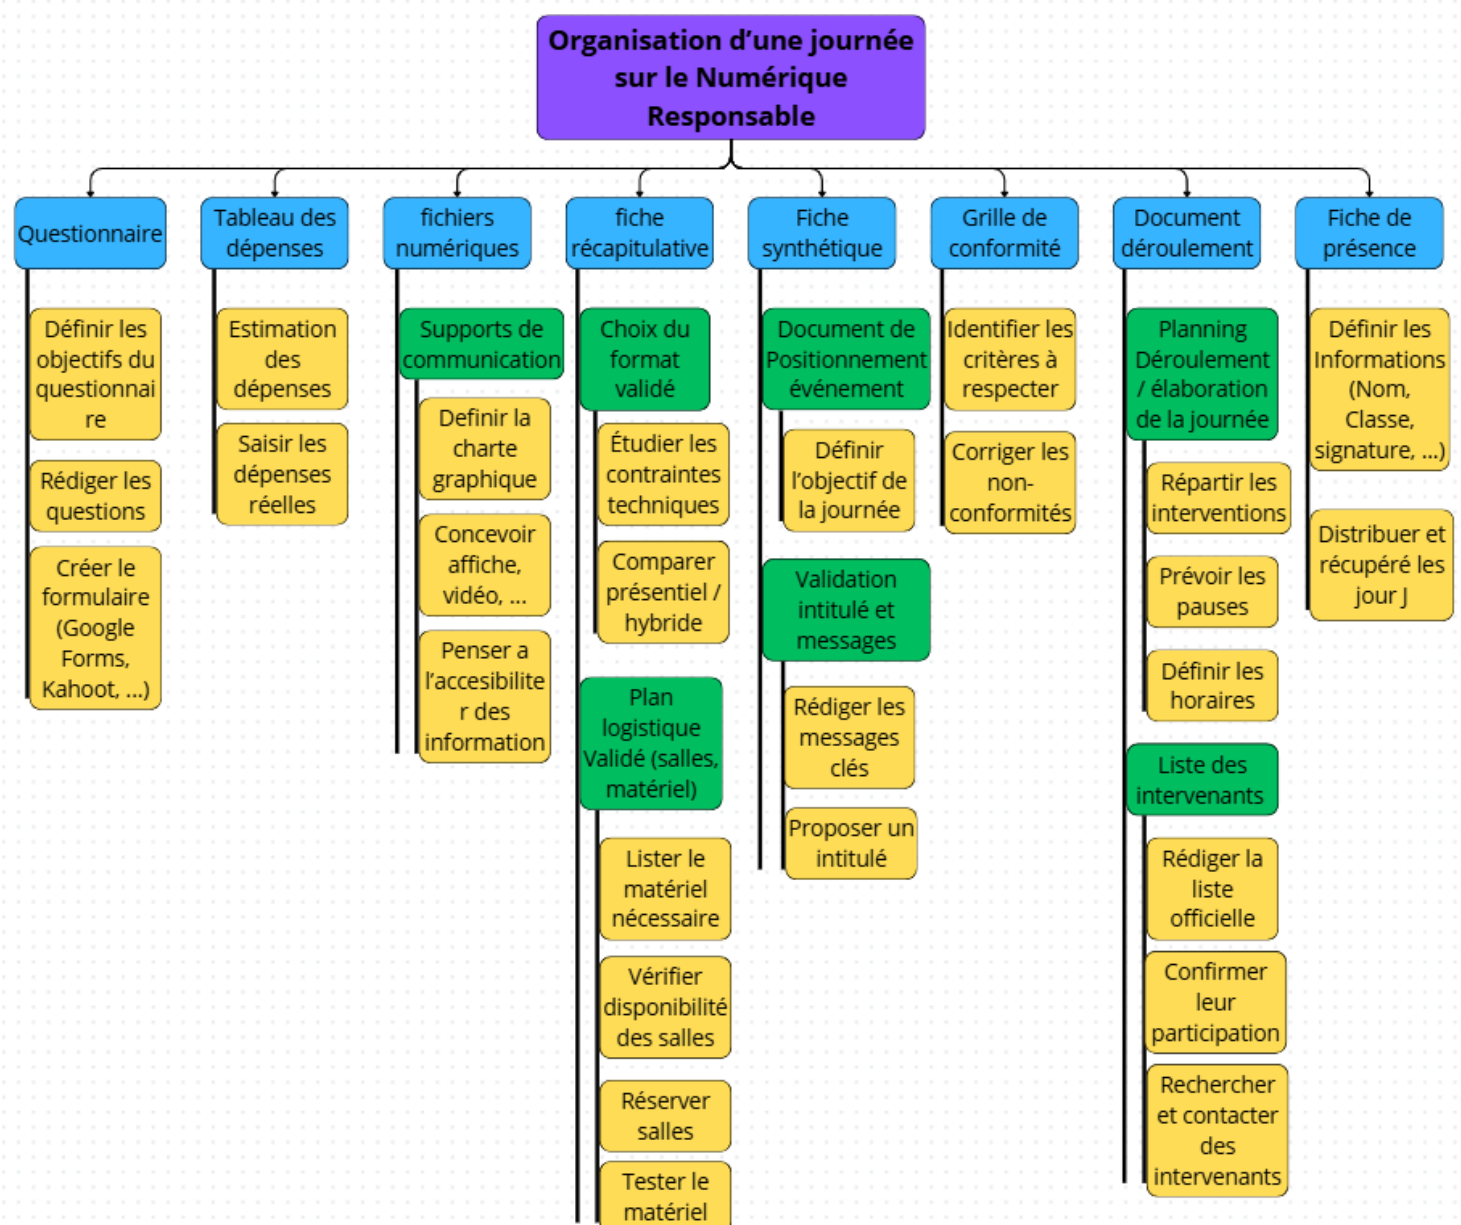

Pour ce WBS, nous avons utilisé les mêmes livrables et également les mêmes sous-livrables qui ont été définis précédemment (dans le RACI et dans les livrables).

7. Planification du projet et dépendances.

1 - Définir l'objectif de la journée

- 1.1 - Proposer un intitulé
- 1.2 - Rédiger les messages clés
- 1.3 - Identifier les critères à respecter
- 1.4 - Corriger les non-conformités
- 1.5 - Rechercher et contacter des intervenants
- 1.6 - Confirmer leur participation
- 1.7 - Rédiger la liste officielle
- 1.8 - Répartir les interventions
- 1.9 - Vérifier disponibilité des salles
- 1.11 - Étudier les contraintes techniques
- 1.12 - Comparer présentiel / hybride
- 1.13 - Lister le matériel nécessaire
- 1.14 - Tester le matériel
- 1.15 - Réserver salles
- 1.16 - Définir les horaires
- 1.17 - Prévoir les pauses

En parallèle :

2 (1.4.1) - Penser à l'accessibilité des information

2.(1.4.2)-Définir la charte graphique

2(1.4.3)- Concevoir affiche, vidéo, ...

3(1.14.1)-Définir les objectifs du questionnaire

3(1.14.2)-Rédiger les questions


3(1.14.3)-Créer le formulaire (Google Forms, Kahoot, ...)

4(1.14.1)-Définir les Informations (Nom, Classe, signature, ...)

4(1.14.2)-Distribuer et récupérer les jour J

Explication de nos choix pour les dépendances critiques : (Rouge)

Pour la définition de l'objectif de la journée, nous partons du principe que si les objectifs sont mal définis, non déterminés ou qui prennent plus de temps à être mis en place cela va causer des retards alors cela créera une forte dépendance pour la suite de nos tâches.

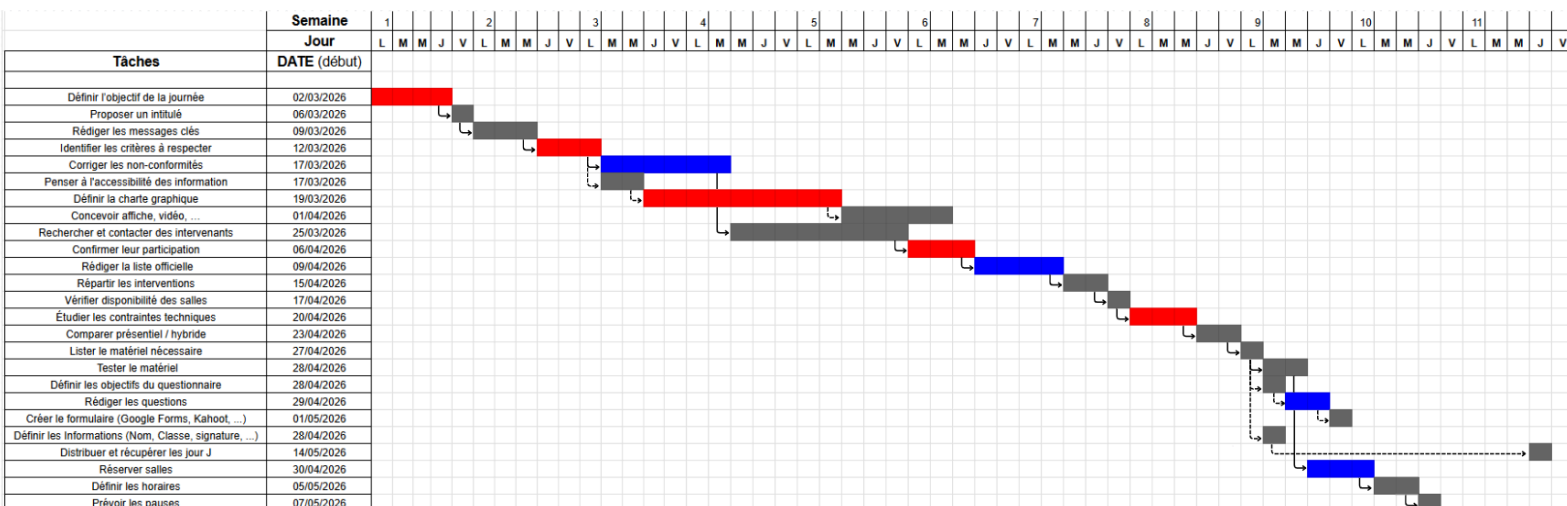

8. Budget prévisionnel et arbitrage réalisés.

Pour le budget concernant les ressources humaines, nous estimons nos dépenses à ~300 euros, en partant du principe que la plupart des intervenants seront issus du bénévolat. Ce choix s'explique par le fait que nous préférons privilégier l'implication volontaire tout en gardant un minimum de budget pour les besoins indispensables. Nous appellerons également des techniciens pour la maintenance ainsi que l'installation de matériels, parce que certaines tâches ne pourront pas être possible d'assurer par nous ou L'IUT (des compétences spécifiques peuvent être nécessaires).

Quant aux prestations externes, les dépenses s'élèvent à 0 car nous ne faisons pas de prestations externes. Nous avons décidé de rester sur un événement simple et cohérent avec nos moyens. En effet, nous avons arbitré de ne pas inclure certains services comme le fait d'assurer un service de restauration, qui n'est pas dans notre périmètre, ou d'assurer un service de transports donc nous pouvons le supprimer, ce qui va nous permettre d'éviter des coûts supplémentaires secondaires.

Du côté du matériel et des outils, nous pensons avoir besoin de ~725 euros ce qui renforce son caractère prioritaire , car nous aurons besoin d'enceintes, de micros. Ce montant correspond à une estimation de l'ensemble des équipements nécessaires pour organiser cet événement dans de bonnes conditions. Une partie du budget est également dédiée à l'achat ou à la location de supports pédagogiques, comme l'organisation de petites activités dans les salles avec des jeux (telles que des activités où l'on pourrait découvrir des composants électroniques, les voir et les étudier afin de comprendre leur fonctionnement), des affiches etc...

Pour tout ce qui touche à la communication et la logistique, nous estimons nos dépenses à ~750 euros ce qui confirme une nouvelle fois son importance, car nous devons payer des graphistes pour les posters, des monteurs pour les vidéos de présentations de l'événement, peut-être même la création d'un site internet potentiel, car une bonne communication est très importante pour garantir l'image de L'IUT.

Le reste du budget, c'est-à-dire ~225 euros, nous le garderons pour prévenir les éventuels problèmes, afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'imprévu sans déséquilibrer le reste du budget.

9. Analyse des risques et modalités de suivi.

Déclencheur	Nature	Origine du risque	Conséquences du risque	Action correctives (curatives ou préventives)
-------------	--------	-------------------	------------------------	---

Mauvaise gestion des salles	logistique	Mauvaise estimation du nombre de personne	Salles surchargées ou salles vides, désorganisation du planning	Préventives : En cas de salles surchargées, on divise le nombre d'intervenants et d'étudiants en deux groupes distincts que nous répartirons dans d'autres salles(prévues à l'avance en cas de surplus). A l'inverse, si les salles sont vides nous réunirons deux salles ensemble.
Mauvaise coordination	Organisationnelle	Mauvaise répartition des tâches	Créer des retards et des confusions sur qui fait quelles tâches	Préventives : Identifier correctement les besoins, les objectifs, livrables, tâches et faire correctement un WBS et ou diagramme de Gantt dans notre cas
Problèmes techniques liés à l'installation ou l'utilisation de matériel (inadapté ou défectueux)	Technique	Erreurs lors de l'installation du matériel, mauvaise vérification en amont du matériel, matériel mal testé ou de qualité insuffisante	Mauvaise image pour l'IUT, mauvaise expérience pour les intervenants, mauvaise immersion ce qui dégrade la qualité de l'événement	Curatives : En cas de problèmes, il faut remplacer le matériel rapidement ou changer de salle. On peut également faire appel à un technicien pour résoudre le problème.
Absences d'intervenants	Humaine	Mauvaise organisation du planning, imprévus personnels, des désistements à la dernière minute	Manque d'intervenants pour correctement animer les rencontres, annulation de certaines activités	Préventives : Réorganiser le planning, prévoir d'autres activités
Dépassement du budget	Financière et/ou organisationnelle	Mauvaise estimation et/ou répartition du budget	Non atteinte de certains objectifs	Préventives : Prioriser les dépenses en fonction de leur importance
Retard sur des tâches et les validations	Temporelle	Retard accumulé	Ne pas avoir fini le projet avant le 14 mai	Préventives : Prévoir plus de temps sur les différentes tâches et les

				validations dans notre diagramme de Gantt et prioriser les tâches en fonction de leur importance.
--	--	--	--	---

Tableau AMDEC simplifié :

Risque identifié	Probabilité d'apparition	Gravité	Probabilité de non-détection	Criticité	Décision / Action envisagée
Mauvaise gestion des salles	3	3	3	27 (Forte)	Réduire : En prévoyant des salles supplémentaires.
Mauvaise coordination	3	3	1	9 (Moyenne)	Éviter : faire en sorte que dès le début les consignes soient claires et les tâches bien réparties.
Problèmes techniques liés à l'installation ou l'utilisation de matériel (inadapté ou défectueux)	2	2	4	16 (Elevé)	Éviter : tester correctement le matériel dans les bonnes salles.
Absences d'intervenants	2	3	4	24 (Forte)	Accepter : Faire en sorte que cela ne se produise pas donc pas de problème de planning principalement.
Dépassement du budget	3	3	2	18 (Forte)	Réduire : Établir le budget prévisionnel conformément aux attentes.
Retard sur des tâches et les validations	4	4	1	16 (Elevé)	Réduire : Anticiper les validation, prévoir des versions intermédiaires.

10. Bilan prévisionnel et retour réflexif.

Pour clôturer ce projet durant lequel nous avons analysé, formaliser et capitaliser. Nous allons faire le bilan prévisionnel.

- Pour les objectifs nous pensons qu'ils seront tous atteints, avec une probabilité élevée nous estimons à 85%.
- De même pour les livrables.
- Nous pensons que le planning (Diagramme de Gantt) ne sera pas totalement respecté car le délai accordé pour certaines tâches reste assez court, avec un risque de léger retard d'environ 5%.
- Le budget reste incertain car les dépenses peuvent varier selon différents facteurs externes, mais nous ne pensons pas dépassé le budget de plus de 15%.
- La majorité des risques peuvent être évités mais pas la totalité, avec une grande partie maîtrisée. On pourra toutefois contourner la plupart des conséquences à l'aide de nos différentes actions.

Objectifs prévus	Objectifs réalisés	Réalisation / Justification
Permettre aux étudiants de rencontrer des personnes de différents horizons tel que les professionnels, les chercheurs ainsi que la Direction de l'IUT au cours du 14 mai.	Les étudiants ont pu rencontrer des personnes de différents horizons tel que les professionnels, les chercheurs ainsi que la Direction de l'IUT au cours de la journée du 14 mai.	Cet objectif a une probabilité élevée (95%) d'être atteint car si le services de communication suit et réalise ses tâches alors la plupart des étudiants pourront rencontrer des intervenants de différents horizons, sinon des ajustements seront faits.
Inviter au minimum 3 intervenants issus de milieux différents confirmés avant le 6 avril 2026.	3 intervenants issus de milieux différents ont été confirmés avant le 6 avril 2026.	Cet objectif a également de grandes chances de se réaliser à hauteur de 100%, car au moins 3 intervenants issus de milieux différents devraient participer à l'événement. Une fois de plus, si le service de communication a correctement respecté ses

		tâches, l'objectif est forcément très concluant, avec une marge de sécurité possible.
Garantir que 100 % des contenus présentés respectent les principes du numérique responsable ainsi que les valeurs de l'IUT avant le 19 mars 2026.	100 % des contenus présentés respectaient les principes du numérique responsable ainsi que les valeurs de l'IUT avant le 19 mars 2026.	Cet objectif a une probabilité élevée (90%) d'être atteint car la totalité des contenus devrait être conforme aux principes du numérique responsable et devrait également respecter les valeurs de l'IUT. Tout en contribuant à la valorisation de l'image de l'IUT. grâce à une bonne coordination des équipes, avec une vérification finale prévue
L'équipe de projet à la nécessité de valider le positionnement général de l'événement, son intitulé et les messages diffusés avant le 19 mars.	Le positionnement général de l'événement, son intitulé et les messages diffusés ont bien été validés avant le 19 mars.	Cet objectif a également une forte chance de se réaliser (85%) puisque l'ensemble des éléments de communications devrait être validés dans les délais. Tout en permettant une bonne cohérence du message et en garantissant une communication compréhensible pour tout le monde, sinon une validation rapide sera faite.
Déterminer et valider le format logistique définitif de la journée (présentiel ou hybride) avant le 23 avril.	Le format logistique définitif de la journée a été déterminé et validé avant le 23 avril.	Nous estimons que cet objectif a de grande chance d'être atteint (100%) car le choix du format (hybride ou présentiel) devrait être choisi dans un délai imparti. Ce qui a également permis d'anticiper les différents besoins techniques et matériels pour le bon déroulement de l'événement, avec une décision provisoire possible.
Concevoir et diffuser au moins dix supports de communication (affiches,	Plus de dix supports de communication ont été conçus et diffusés tout en	Cet objectif devrait être atteint avec une probabilité élevée (92%) car plus de dix

réseaux sociaux) conformes à la charte graphique de l'IUT avant le 8 mars	étant conformes à la charte graphique de l'IUT avant le 8 mars	supports de communication seront censés être conçus et diffusés dans les délais, tout en respectant la charte graphique de l'IUT ainsi qu'en assurant une communication cohérente lors de l'événement, avec possibilité d'ajustement si nécessaire.
Organiser la journée du 14 dans la limite du budget maximal autorisé de 2 000 €	L'organisation de la journée du 14 à légèrement dépasser le seuil maximal autorisé.	Cet objectif a une chance d'être dépassé (15%) car le budget final a légèrement dépassé le seuil maximal autorisé, environ 2115 euros. Ce qui s'explique par certains imprévus qui ont coûtés certaines pertes, avec des ajustements budgétaires possibles.
Garantir un contenu accessible et compréhensible pour au moins 60% des étudiants (même non spécialiste)	60% des étudiants affirment avoir compris le contenu présenté durant l'événement. Et possèdent une note au questionnaire supérieur à 12	Cet objectif a une probabilité élevée d'être réalisé (90%) car nous estimons que plus de 60% des étudiants déclareront avoir compris le contenu et posséderont une moyenne supérieure à 12 au questionnaire proposé sur l'ensemble des éléments abordés durant l'événement, avec des supports simplifiés en cas de difficulté.

Le REX :

Tout au long du projet, nous avons dû faire des choix, qui ont fait en sorte que le projet ait bien abouti à ses objectifs ou non. Nous allons maintenant analyser ce qui a fonctionné, et également ce qui a moins fonctionné.

Tout d'abord, la structure du projet faite à l'aide du WBS et du planning, nous a permis une bonne communication ce qui nous assuré une meilleure coordination, en ayant chacun une vision claire sur les tâches à gérer, ce qui a également faciliter l'organisation de projet et la gestion des risques.

En revanche, ce que nous avons le moins réussi, sont la répartition du budget et la planification des tâches à l'aide du diagramme de Gantt. Cela n'a pas été évident de prioriser les dépenses ainsi que les tâches tout en respectant des contraintes imposées tel que le délai accordé à celle-ci, qui a été trop court, ce qui a demandé beaucoup de changements et ce qui a créé du retard. De plus, nous avons remarqué au cours du projet, que la répartition des tâches était inégale, lors de la réalisation de notre RACI, malgré ça nous avons tout de même réussi à nous en sortir.

Tout au long de ce projet nous avons pu apprendre, découvrir et améliorer nos compétences et donc comprendre ce qui a fonctionné ou non. Nous retiendrons donc que nous devons mieux prioriser les tâches, anticiper les validations et une meilleure répartition des rôles lors de notre prochaine gestion de projets.

11. Contribution individuelle et prise de recul personnelle.

Durant cette SAE nous avons toujours, pour chacune des étapes, travaillé ensemble car nous sommes beaucoup plus efficaces et cela nous a également permis d'instantanément détecter les erreurs et incohérences mais aussi de rester motivé car nous ne restions pas chacun dans son coin, pour à terme mettre notre travail en commun. Ce qui nous a évité de perdre du temps et à créer de l'entraide ce qui nous a aidés à mieux comprendre certaines notions du cours.

Subséquentement nous avons quasiment le même recul personnel à la fin de ce projet. Nous avons trouvé que cette SAE était intéressante, nous avons su comment travailler avec de bonnes méthodes et rester organisé tout au long du projet car en effet cette SAE exige une très bonne organisation, beaucoup de notions du cours ainsi que de bonnes méthodes.

12. ANNEXES :

1- Information du texte

- L'université veut renforcer ses actions en faveur du **numérique responsable**.
- Le numérique responsable pour ses **pratiques internes** et la **sensibilisation étudiante**.
- Organiser **au cours du semestre** à venir, une **journée universitaire dédiée aux enjeux du numérique responsable**.
- Une journée destinée aux **étudiants**, mais également à d'autres **publics universitaires**.
- Intitulé événement, intitulé "**Le numérique responsable : enjeux, usages et perspectives pour les étudiants**".
- Croiser des regards : **académique, institutionnels et professionnels**.
- **Accessible** majoritairement au **étudiant**.

- Nous devons **piloter l'organisation de l'événement, coordonner, planifier et arbitrer.**
- Lien avec de nombreux **acteurs internes et externes** (aucune autorité hiérarchique).
- **Valider le positionnement général de l'événement, son intitulé, les messages diffusés (garantir cohérence institutionnelle).**
- Service de communication impose que **les actions de promotion** respectent une **charte graphique précise et validé** ce qui peut **allonger les délais.**
- Le service logistique souligne que la **disponibilité des salles et du matériel** dépend du **format (présentiel, hybride)** et du **nombre d'intervenants invités.**
- Plusieurs **enseignants** intéressés pour **intervenir** mais **disponibilités incertaines** (obligation pédagogique et recherche).
- Des **associations étudiantes** proposent de contribuer à la **mobilisation des participants** mais cela dépend du **bénévolat et des contraintes de calendrier.**
- Possibilité de faire **intervenir des acteurs externes (aucun engagement ferme pris a ce stade)** : associations spécialisées, professionnels du numérique, experts du développement durable.
- L'université dispose d'un **budget maximum de 2 000 €** pour **l'ensemble de l'événement.**
- Le **budget** doit couvrir **l'ensemble des dépenses nécessaires** : communication, logistique, accueil des intervenants, prestations éventuelles (sécurité, restauration, matériel audiovisuel) tout en **respectant les procédures internes de validation.**
- Des **partenariats externes** pourraient **compléter ou réorienter** certaines **dépenses** (aucune garantie d'obtention ni du montant)
- **Interdépendances fortes** apparaissent car :
 - 1- Le lancement de la **communication** dépendra des **validation institutionnelles.**
 - 2- Le choix du **format** influencera directement les **besoins logistiques** et les **coûts.**
 - 3- Le **nombre et profil des intervenants** impacteront le **budget, le planning et la qualité perçue de l'événement.**
 - 4- La **disponibilité tardive** de certains acteurs clés pourrait **remettre en cause certaines décisions prises en amont.**
- La journée universitaire se tiendra le **jeudi 14 mai** pour des raisons institutionnelles et de disponibilité des espaces et cette date est **non négociable.**
- Toute **modification du format, du contenu ou des modalités d'organisation** doit donc **prendre en compte cette contrainte temporelle forte** (jeudi 14 mai).
- **Envisager des scénarios alternatifs, des marges de sécurité, anticiper les conséquences des décisions prises dans l'incertitude.**
- Certaines décisions sont **irréversible**

2- Tableau de bord

DATE	Modifications et/ou Ajouts
31/01/2026	Synthèse => explication du projet + mise en page du projet
03/02/2026	Explication de pourquoi c'est un projet
06/02/2026	Création du tableau des besoins, leurs traduction et de leur analyses
08/02/2026	Remplissage du cahier des charges simplifié + correction du tableau de besoin
09/02/2026	Correction des fautes et correction du cahier des charges simplifié
13/02/2026	Listes des objectifs principal et secondaire
20/02/2026	Identification des livrables + complétion des objectifs secondaires + correction de nos besoins
23/02/2026	Changement des objectifs car oubli des objectifs stratégiques et opérationnels + explication quel livrable correspond à quel objectif
25/02/2026	Correction des objectifs et livrables + Acteurs, organisation et gouvernance + RACI
27/02/2026	Rajout de description des tableaux (conseillé)
28/02/2026	Modification des Livrables + des sous-livrables dans le RACI
02/03/2026	Ajout de description pour le RACI + WBS
11/03/2026	Début de l'organisation des tâches issues du WBS
13/03/2026	organisation des tâches issues du WBS + jalons + Diagramme de Gantt + modification de date dans les objectifs des livrables
19/03/2026	Budget prévisionnel + arbitrages réalisés
20/03/2026	Fin de la partie 9, 10 et 11 / Création du diaporama.
26/03/2026	Correction apportée suite aux corrections suggérées.
